




Handwritten signature of Ing. Jan Cehák



G+ s.r.o.		Sadová 625, 251 68 Kamenice			
ZPRACOVAL: O. HAVLIČEK, P. KOŠUMBERSKÝ		OVĚŘIL: Ing. J. CEHÁK	DATUM: 15.11.2006	MĚŘITKO:	1:250
INVESTOR: Obec Louňovice			LOKALITA: Louňovice	FORMÁT:	A4
AKCE: Rozšíření ČOV Louňovice na kapacitu 2000 E.O.					
ČÍSLO PŘÍLOHY: 1/1					

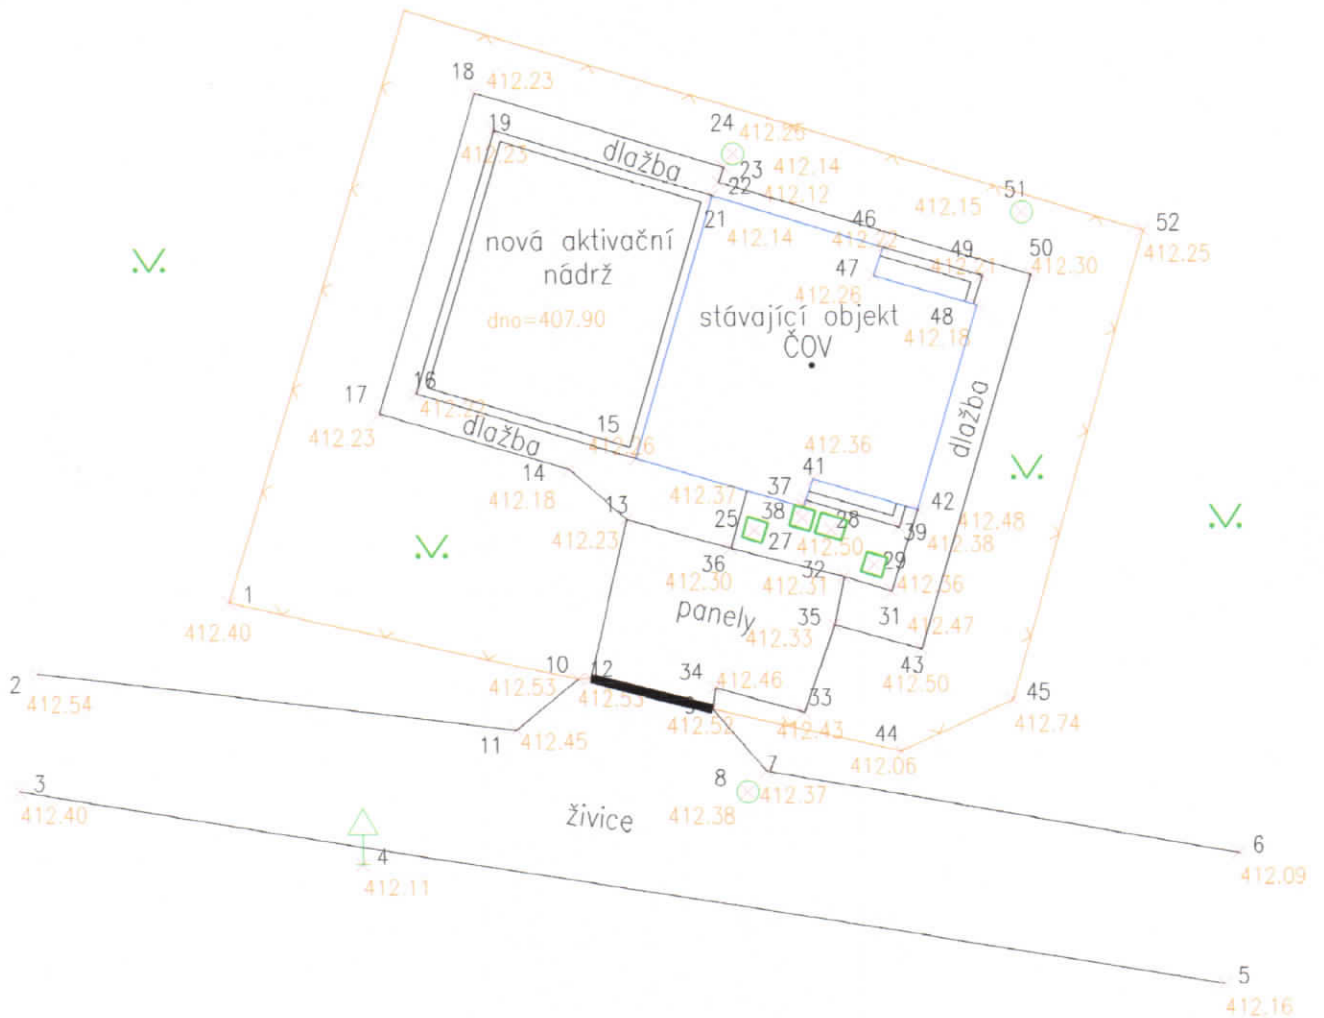

Handwritten signature

G+ s.r.o.		Sadová 625, 251 68 Kamenice			
ZPRACOVAL: O. HAVLÍČEK, P. KOŠUMBERSKÝ		OVĚŘIL: Ing. J. CEHÁK	DATUM: 15.11.2006	MĚŘÍTKO: 1:250	
INVESTOR: Obec Louňovice			LOKALITA: Louňovice	FORMÁT: A4	
AKCE: Rozšíření ČOV Louňovice na kapacitu 2000 E.O.					
ČÍSLO PŘÍLOHY: 1/1					

Soubor: Seznam souřadnic

Zakázka: ČOV - Louňovice

Lokalita: Louňovice

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: balt p.v.

Předč. Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
1	719 707.45	1 057 619.09	412.40			plot
2	719 713.81	1 057 621.43	412.54			cesta
3	719 714.42	1 057 625.36	412.40			cesta
4	719 703.11	1 057 627.83	412.11			Dopravní značka
5	719 674.70	1 057 631.94	412.16			cesta
6	719 674.19	1 057 627.57	412.09			cesta
7	719 689.76	1 057 624.85	412.37			cesta
8	719 690.39	1 057 625.51	412.38			kanál
9	719 691.54	1 057 622.75	412.52			plot
10	719 695.96	1 057 621.74	412.53			plot
11	719 698.00	1 057 623.40	412.45			cesta
12	719 695.55	1 057 621.72	412.53			dlažba,beton
13	719 694.30	1 057 616.40	412.23			dlažba,beton
14	719 696.19	1 057 614.77	412.18			dlažba,beton
15	719 693.98	1 057 614.42	412.26			budova
16	719 701.21	1 057 612.23	412.22			nádrž
17	719 702.45	1 057 612.89	412.23			dlažba,beton
18	719 699.20	1 057 602.26	412.23			dlažba,beton
19	719 698.55	1 057 603.49	412.23			nádrž
20	719 701.46	1 057 599.51	412.18			plot
21	719 691.37	1 057 605.70	412.14			budova
22	719 691.17	1 057 605.26	412.12			dlažba,beton
23	719 690.99	1 057 604.77	412.14			dlažba,beton
24	719 690.68	1 057 604.32	412.25			kanál
25	719 690.08	1 057 616.79	412.37			kovový poklop
27	719 688.51	1 057 616.40	412.37			kovový poklop
28	719 687.56	1 057 616.78	412.38			kovový poklop
29	719 686.15	1 057 617.98	412.36			kovový poklop
31	719 685.59	1 057 618.85	412.47			dlažba,beton
32	719 687.15	1 057 618.38	412.31			dlažba,beton
33	719 688.50	1 057 622.87	412.43			dlažba,beton
34	719 691.44	1 057 622.05	412.46			dlažba,beton
35	719 687.49	1 057 619.93	412.33			dlažba,beton
36	719 690.89	1 057 617.40	412.30			dlažba,beton
37	719 688.46	1 057 616.03	412.50			budova
38	719 688.38	1 057 615.81	412.48			budova
39	719 685.31	1 057 616.73	412.38			čistící nádrž
41	719 688.14	1 057 615.13	412.36			budova
42	719 684.70	1 057 616.13	412.48			budova
43	719 684.61	1 057 620.76	412.50			dlažba,beton
44	719 685.31	1 057 624.18	412.06			plot
45	719 681.60	1 057 622.50	412.74			plot
46	719 685.76	1 057 607.45	412.22			budova
47	719 686.07	1 057 608.39	412.26			budova
48	719 682.67	1 057 609.41	412.18			budova
49	719 682.50	1 057 608.42	412.21			čistící nádrž
50	719 680.88	1 057 608.39	412.30			dlažba,beton
51	719 681.16	1 057 606.31	412.15			kanál
52	719 677.16	1 057 606.94	412.25			plot
